GPOI · UNITÀ 6

Novaula per il quartiere

Un progetto vero, vissuto in classe dall'idea alla consegna: una web app per i turni dei volontari di un'associazione del quartiere.

PER COMINCIARE

Hai mai fatto volontariato o fatto parte di un'associazione?

SONDAGGIO

- **A** Sì, con regolarità
- **B** Qualche volta
- **C** No, ma mi piacerebbe
- **D** No

PERCHÉ UN CASO CONCRETO

Si impara a gestire un progetto gestendone uno

Un committente

Con bisogni veri, poco tempo e idee che cambiano.

Tutte le fasi

Dall'idea al rilascio: nessuna salta, nemmeno la chiusura.

Tutti i documenti

Charter, verbali, WBS, Gantt, specifiche, test, relazione.

> **All'esame**: questo progetto è un'esperienza di classe che puoi raccontare: le fasi, il tuo ruolo, un documento che hai prodotto, un problema che avete risolto.

IL CASO

L'associazione "Quartiere Solidale"

Un'associazione di volontariato di esempio, nel nostro quartiere. Circa **80 volontari** per tre attività:

- **Banco alimentare**: ogni sabato 9-12, servono 6 persone
- **Doposcuola**: dal lunedì al giovedì 15-17, servono 3 persone
- **Cura del parco**: la prima domenica del mese, servono 10 persone

Oggi

I turni si organizzano con un gruppo WhatsApp e un foglio appeso in sede. Alcuni turni restano scoperti, altri hanno doppioni. La coordinatrice passa ore al telefono.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Qual è il vero bisogno della coordinatrice?

QUIZ

A Un'app moderna, come quelle che usano i ragazzi

B Un sito nuovo con il logo dell'associazione

C Sapere in anticipo quali turni sono scoperti, senza telefonare a tutti

D Un gruppo WhatsApp con regole più severe

GLI STAKEHOLDER

Chi ha un interesse nel progetto

Committente

L'associazione, rappresentata dalla presidente.

Utente chiave

La coordinatrice dei turni.

Utenti finali

I volontari, dal telefono.

Fornitore

La classe 5F, con il docente responsabile.

Sponsor

La dirigente scolastica: autorizza e mette il server.

Beneficiari

Famiglie e persone assistite.

DIVIDI IN CATEGORIE

Chi lo fa?

CARTE DA SISTEMARE

- Pianifica i tempi
- Si iscrive al turno
- Riceve il promemoria
- Firma l'accordo
- Approva i requisiti
- Scrive il codice
- Installa sul server

Committente

Fornitore

Utente finale

IL CICLO DI VITA

Quattro fasi, dall'idea alla consegna

Avvio

Bisogno, accordo, kick-off, project charter, fattibilità, rischi.

Approfondimento

Contesto, WBS, Gantt, ruoli, verbali.

Realizzazione

Requisiti, interfaccia, database, codice, monitoraggio.


Chiusura

Test, installazione, rilascio, presentazione.

TRASCINA LE ETICHETTE

Le dieci settimane del progetto

Realizzazione | Chiusura | Preventivo | Project charter | Avvio | Manutenzione | Rilascio | Approfondimento

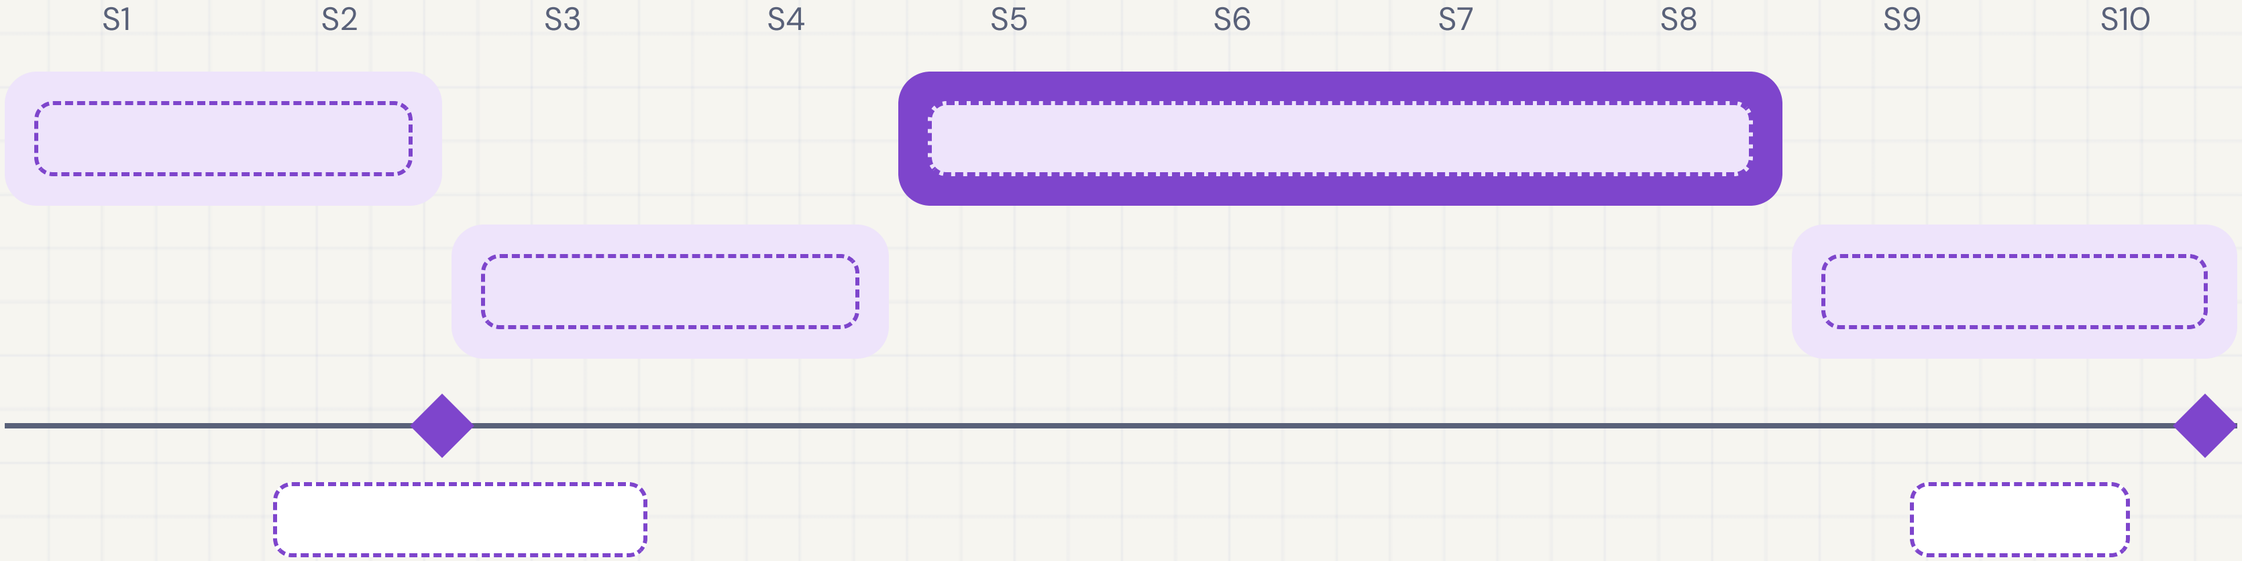

METTI IN ORDINE

La storia del progetto, in sette passi

1. Si firma l'accordo e si fa il kick-off
2. Si approva il project charter
3. Si preparano WBS e Gantt
4. Collaudo con i volontari e rilascio
5. La coordinatrice racconta il problema alla classe
6. Relazione finale e lezioni apprese
7. Si sviluppano e si provano le funzioni

IN GRUPPO · 30 minuti

Intervista alla coordinatrice

1. Uno studente (o il docente) interpreta la coordinatrice, con la scheda del ruolo.
2. Ogni squadra prepara 6 domande: chi, che cosa, quando, quanti, come si fa oggi, che cosa va storto.
3. Intervista di 15 minuti; un segretario per squadra prende appunti.
4. Scrivete il verbale con l'elenco dei bisogni emersi, ognuno con un dato.
5. Consegnate **NQ-VRB-001_intervista_rev0.odt**.

Controllo: almeno 5 bisogni, ognuno con un numero (quanti volontari, quanti turni, quante ore). Avete scoperto anche un vincolo che la coordinatrice non ha detto subito?

ABBINA

Ogni ruolo, il suo volto nel nostro progetto

Committente	Le quattro squadre della 5F
Project manager	Il docente di GPOI
Sponsor	Uno studente scelto dalla classe
Utente chiave	La dirigente, che autorizza e mette il server
Team di progetto	L'associazione Quartiere Solidale
Garante del metodo	La coordinatrice dei turni

COME LAVOREREMO

Le regole del progetto NQ

Le squadre

- Analisi e interfaccia
- Sviluppo front-end
- Back-end e database
- Test e documentazione

I documenti

- Codici NQ-tipo-numero e revisioni
- Cartella condivisa per fasi
- Registro dei documenti
- Verbale di ogni riunione

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

A che cosa serve un'impresa, a che cosa serve un progetto

> **Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell'indice dei profitti?**
>
> **Adriano Olivetti**, imprenditore, discorso ai lavoratori per l'inaugurazione dello stabilimento di Pozzuoli, 1955

Il nostro progetto non ha profitto: il suo valore si misura in turni coperti e ore di telefono risparmiate.

METTITI ALLA PROVA

A metà progetto la coordinatrice chiede una chat tra volontari. Il PM...

QUIZ

- **A** La aggiunge subito: il cliente ha sempre ragione
- **B** Valuta l'impatto su tempi e lavoro e decide con il committente, per iscritto
- **C** Rifiuta: quello che non c'era all'inizio non si fa
- **D** La fa sviluppare di nascosto nel fine settimana

PONTE CON L'OGGI

Se un'AI scrive l'app in un pomeriggio…



> Nel nostro progetto l'AI si può usare come aiuto al codice, dichiarandolo nel registro: ogni riga generata va letta, capita e provata da una persona del team.

SFIDA

Apri il lucchetto: quanti posti da coprire?



Prendi i dati dell'associazione e calcola quanti posti di volontario vanno coperti in un mese di **4 settimane**, con una sola prima domenica del mese.

- Banco alimentare: 1 turno a settimana, 6 posti
- Doposcuola: 4 turni a settimana, 3 posti ciascuno
- Parco: 1 turno al mese, 10 posti

```
codice
```

AL COMPUTER · 25 minuti

La mappa degli stakeholder

1. Apri **app.diagrams.net** (non serve un account) e scegli un diagramma vuoto.
2. Disegna una griglia 2 × 2: in orizzontale l'**interesse**, in verticale il **potere** di decidere.
3. Metti nei quadranti almeno 8 stakeholder del progetto NQ.
4. Accanto a ognuno scrivi come lo terrete informato (riunione, email, demo).
5. Esporta in PNG e consegna **NQ-stakeholder.png**.

Controllo: presidente e coordinatrice in alto a destra (potere e interesse alti), i volontari in basso a destra, la dirigente in alto. Ogni stakeholder ha un canale di comunicazione.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

sponsor | fornitore | chiusura | collaudo | committente | bisogno | approfondimento

Chi chiede il lavoro e alla fine lo accetta è il _____; chi lo realizza è il _____.

Le fasi sono avvio, _____, realizzazione e _____.

Prima di scegliere la soluzione bisogna capire il _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Il caso: turni dei volontari di Quartiere Solidale
- Bisogno prima della soluzione
- Committente, fornitore, utenti, sponsor, beneficiari
- Avvio, approfondimento, realizzazione, chiusura
- Ogni nuova richiesta passa da una modifica scritta
- Documenti codificati NQ, come nell'Unità 5

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.
