GPOI · UNITÀ 4

# La comunicazione di progetto

L'e-commerce del Panificio è al giorno 10: il back-end è in ritardo e i costi corrono. Chi deve saperlo, che cosa, quando e con quale canale? Il piano della comunicazione, dalle riunioni alla chiusura.

PER COMINCIARE

# Il progetto costerà 2 000 € in più alla software house. Come lo dici al tuo capo?

SONDAGGIO

- **A** Email dettagliata con il foglio di calcolo
- **B** Messaggio in chat, breve
- **C** Telefonata
- **D** Incontro di persona, con i numeri e una proposta

# Il project manager sta al centro

- Gran parte del lavoro del PM è **comunicare**: ascoltare, informare, negoziare, decidere.
- Gli **stakeholder** sono tutti quelli che influenzano il progetto o ne sono influenzati.
- Ognuno ha bisogno di informazioni **diverse**, con un linguaggio e una frequenza diversi.

## Potere e interesse

**Alto potere, alto interesse**: coinvolgere da vicino (il Sig. Rossi).


**Basso potere, alto interesse**: tenere informati (i commessi).

Matrice di Mendelow

ETICHETTA LO SCHEMA

# Ogni comunicazione ha le stesse parti

Feedback | Emittente | Ricevente | Sponsor | Baseline | Rumore | Messaggio | Canale

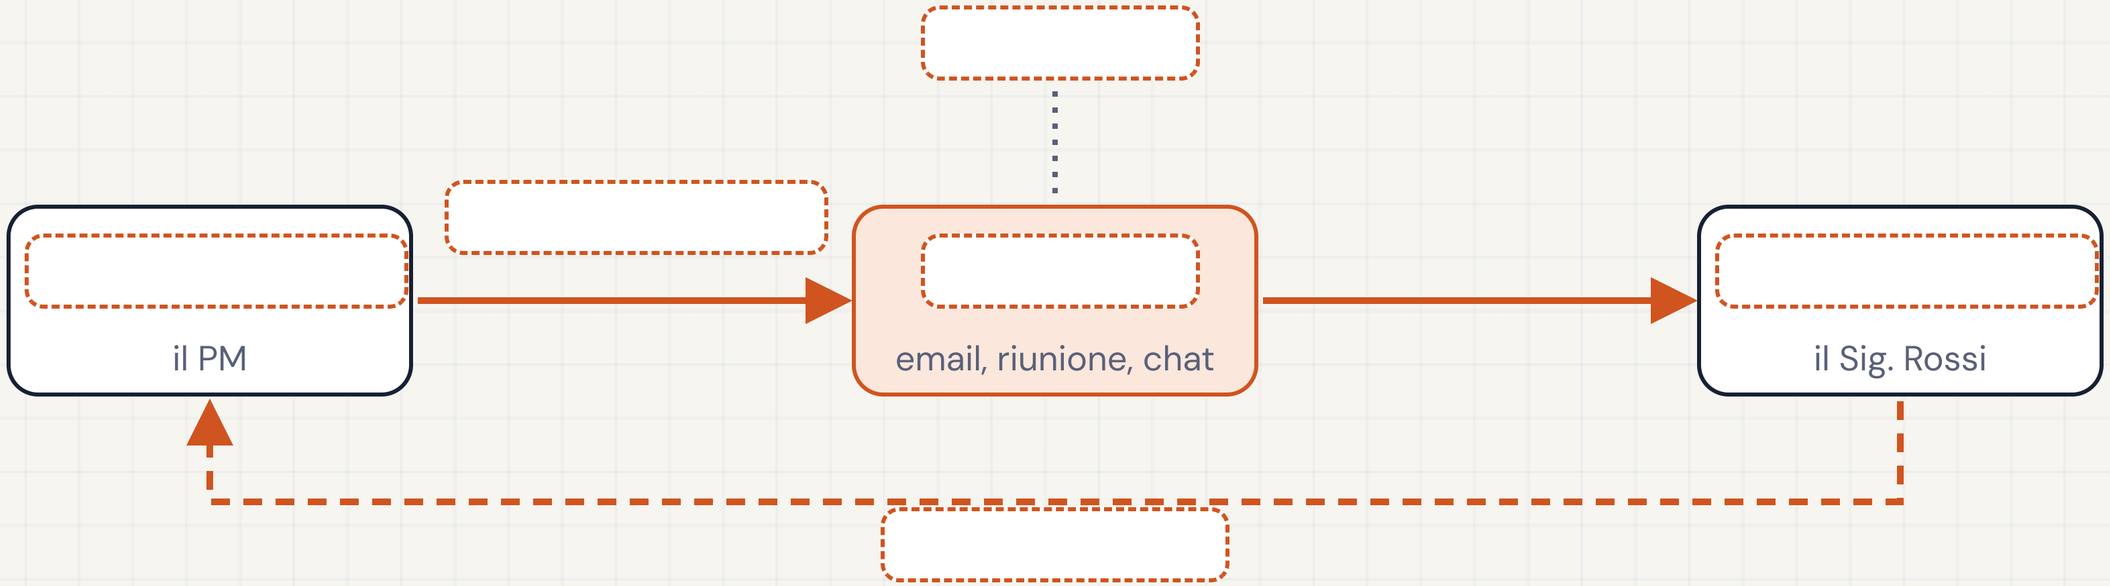

QUIZ A TRABOCCHETTO

# Email a 12 persone: "Rispondete entro venerdì se ci sono problemi". Nessuno risponde. Che cosa sai?

QUIZ

A Che nessuno ha problemi

B Che tutti sono d'accordo

C Niente di certo: manca il feedback

D Che l'email è stata letta

IL PIANO DELLA COMUNICAZIONE

# Chi, che cosa, quando, come

| Destinatario | Che cosa | Quando | Come | Chi invia |
|---|---|---|---|---|
| Sig. Rossi | Stato, milestone, decisioni da prendere | ogni 2 settimane | incontro + email di riepilogo | PM |
| Team | Attività, blocchi, priorità | ogni giorno, 15 minuti | stand-up + chat | PM |
| Titolare software house | Costi, rischi, EV | ogni venerdì | report di stato | PM |
| Commessi | Come usare gli ordini online | prima della messa online | formazione in negozio | analista |
| Fornitore pagamenti | Requisiti tecnici, test | all'avvio di E | email e ticket | back-end |

ABBINA

# Il messaggio giusto per ogni destinatario

| | | |
|---|---|---|
| **Sig. Rossi** | --- | "Ci servono le credenziali dell'ambiente di test" |
| **Team** | --- | "Martedì alle 15 vi mostriamo come gestire gli ordini" |
| **Titolare software house** | --- | "Il back-end è al 60%: oggi rivediamo chi fa il catalogo" |
| **Commessi** | --- | "Servono le foto dei prodotti entro venerdì per restare nei tempi" |
| **Fornitore pagamenti** | --- | "CPI 0,80, EAC 10 000 €: propongo tre azioni" |

AL COMPUTER · 25 minuti

# Il piano della comunicazione del Panificio

1. In Calc crea le colonne: **Destinatario, Che cosa, Quando, Come, Chi invia, Tipo**.
2. Inserisci almeno 7 righe: i 5 della slide più i clienti del panificio e il commercialista.
3. Nella colonna Tipo scrivi push, pull o interattiva.
4. Aggiungi una riga per l'annuncio della messa online ai clienti.
5. Salva **piano-comunicazione.ods** e consegnalo.

**Controllo:** ogni riga ha un solo "Chi invia" e una frequenza concreta ("ogni lunedì", non "spesso"). Il Sig. Rossi ha almeno un canale interattivo.

LA COMUNICAZIONE IN ESECUZIONE

# Riunioni, report, verbali, modifiche

### Riunioni

Kick-off all'avvio, stand-up quotidiano, SAL periodico.

### Report di stato

Semaforo verde, giallo, rosso su tempi, costi, qualità.

### Verbali

Decisioni, responsabili e scadenze, inviati a tutti.

### Modifiche

Ogni richiesta del cliente si scrive, si valuta e si approva.

**Escalation**: se un problema supera i poteri di chi lo vede, sale al livello superiore, con tempi e canali stabiliti prima.

METTI IN ORDINE

# Una riunione che non fa perdere tempo

1. Discutere un punto alla volta
2. Inviare l'ordine del giorno in anticipo
3. Iniziare in orario e nominare chi verbalizza
4. Definire l'obiettivo e chi deve esserci
5. Inviare il verbale entro un giorno
6. Riepilogare decisioni, responsabili e scadenze

AL COMPUTER · 25 minuti

# Il report di stato per il Sig. Rossi

1. Riprendi i dati del SAL al giorno 10: back-end al 60%, fine prevista ancora al giorno 17.
2. In Writer, una pagina: semaforo su tempi e qualità, che cosa è finito, che cosa viene dopo.
3. Scrivi che cosa serve da lui, con una data (le foto e i prezzi per il catalogo).
4. Niente sigle interne: niente CPI, EAC, back-end.
5. Salva **report-rossi-giorno10.odt** e consegnalo.

**Controllo:** un compagno che non conosce GPOI capisce in un minuto se il progetto è in tempo e che cosa deve fare il cliente.

LA COMUNICAZIONE IN CHIUSURA

# Un progetto finisce quando lo si dichiara chiuso

- **Accettazione formale**: il cliente firma il verbale di collaudo.
- **Relazione finale**: risultati, tempi e costi a consuntivo.
- **Lezioni apprese**: che cosa rifare e che cosa evitare.
- **Archivio** ordinato di documenti e codice.
- **Passaggio** a chi farà assistenza e manutenzione.
- **Riconoscimento** del lavoro del team.

> È la fase adjourning di Tuckman: il team si scioglie, ma quello che ha imparato resta all'impresa.

DIVIDI LE CARTE

# In esecuzione o in chiusura?

CARTE DA SISTEMARE

- Richiesta di modifica
- Verbale del SAL
- Riunione delle lezioni apprese
- Consegna dell'archivio
- Verbale di collaudo firmato
- Report di stato settimanale
- Segnalazione di un ritardo
- Relazione finale a consuntivo

## Esecuzione

## Chiusura

GLI STRUMENTI

# Spingere, lasciar prendere, parlarsi

### Push

Si invia a destinatari precisi: email, report, newsletter. Non garantisce che venga letto.

### Pull

Si pubblica e chi serve va a cercarlo: wiki, cartella condivisa, README del repository.

### Interattiva

Scambio in tempo reale: riunione, videochiamata, telefonata. Dà feedback subito.

La chat del team sta a metà: veloce come una telefonata, ma i messaggi si perdono se le decisioni non finiscono in un documento.

DIVIDI LE CARTE

# Push, pull o interattiva?

CARTE DA SISTEMARE

- Notifica di rilascio
- Telefonata
- Videochiamata con il cliente
- Cartella condivisa
- Stand-up di 15 minuti
- README del repository
- Wiki del progetto
- Email con il report
- Newsletter ai clienti

## Push

## Pull

## Interattiva

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

# La legge di Conway

> **Le organizzazioni che progettano sistemi sono costrette a produrre progetti che copiano le loro strutture di comunicazione.**

**Melvin Conway**, informatico statunitense, in "How Do Committees Invent?", *Datamation*, aprile 1968

Come comunica il team, così sarà fatto il software.

METTITI ALLA PROVA

# Tre gruppi che non si parlano sviluppano insieme un'app. Che cosa è più probabile?

QUIZ

A Un'app perfettamente integrata

B Tre parti con collegamenti fragili tra loro

C Un'app più veloce da sviluppare

D Nessun effetto sul software

TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE

# Il verbale lo scrive l'AI?



**All'esame:** porta un esempio di piano della comunicazione o di verbale di un tuo progetto (PCTO, laboratorio) e collega la legge di Conway all'architettura del software.

SFIDA FINALE

# Apri il lucchetto dei canali



- Prime due cifre: i canali di comunicazione tra le 7 persone del progetto (6 del team più il Sig. Rossi).
- Ultime due cifre: i canali se le persone diventano 10.

codice

BIGLIETTO D'USCITA

# Trascina le parole al posto giusto

accettazione | feedback | pull | push | baseline | verbale | canale

Il piano della comunicazione dice chi riceve che cosa, quando e con quale _____. Senza _____ non sai se il messaggio è arrivato. Le decisioni di una riunione finiscono nel _____; il progetto si chiude con l'_____ del cliente. Una wiki è uno strumento _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

# Cosa portiamo a casa

- Il PM è il centro della comunicazione
- Emittente, messaggio, canale, ricevente, feedback
- Piano: chi, che cosa, quando, come, chi invia
- Esecuzione: riunioni, report, verbali, modifiche
- Chiusura: accettazione, relazione, lezioni apprese
- Push, pull, interattiva; e la legge di Conway

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.
