GPOI · UNITÀ 4

Il ciclo di vita di un progetto

Ogni progetto nasce, cresce e finisce. Seguiamo un caso dall'idea alla consegna: l'e-commerce del Panificio Rossi.

PER COMINCIARE

Secondo te, in quale fase un progetto rischia di più di fallire?

SONDAGGIO

- **A** All'avvio, quando si decide che cosa fare
- **B** Nella pianificazione dei tempi e dei costi
- **C** Nell'esecuzione, mentre si lavora
- **D** Alla chiusura, alla consegna al cliente

LE FASI

Cinque gruppi di attività, dall'idea alla consegna

1

Avvio

Perché lo facciamo? Obiettivi, fattibilità, nomina del PM.

2

Pianificazione

Come, quando, con quali risorse e costi.

3

Esecuzione

Il team realizza i deliverable.

4

Chiusura

Collaudo, accettazione, archivio, lezioni apprese.

Monitoraggio e controllo non è una casella in fila alle altre: accompagna tutto il progetto, dall'avvio alla chiusura, confrontando continuamente il fatto con il previsto.

LA DEFINIZIONE

Che cosa vuol dire "ciclo di vita"

> **La serie di fasi che un progetto attraversa dal suo inizio fino al suo completamento.**

Project Management Institute, PMBOK Guide, 6ª edizione, 2017, glossario (voce "Project Life Cycle")

Un progetto è temporaneo: ha un inizio e una fine. Per questo ha un ciclo di vita, mentre il lavoro di tutti i giorni (le attività operative) si ripete senza una fine prevista.

PUZZLE

La storia dell'e-commerce del panificio, in ordine

1. Il team sviluppa il sito e carica il catalogo
2. Il panificio chiede un sito per vendere pane e dolci online
3. Si valuta la fattibilità e si firma il project charter
4. Si scompone il lavoro e si stimano tempi e costi
5. Si archiviano i documenti e si scrivono le lezioni apprese
6. Il cliente collauda il sito e firma l'accettazione

ENTRATE E USCITE

Ogni fase risponde a una domanda e produce un documento

Fase	Domanda chiave	Che cosa produce
Avvio	Perché e che cosa?	Studio di fattibilità, project charter, elenco degli stakeholder
Pianificazione	Come, quando, con quanto?	Piano di progetto: WBS, reticolo, Gantt, budget, rischi
Esecuzione	Lo stiamo facendo?	I deliverable: codice, grafica, catalogo, manuale
Monitoraggio	Va come previsto?	Stati di avanzamento (SAL), richieste di modifica
Chiusura	Abbiamo finito davvero?	Verbale di collaudo, relazione finale, lezioni apprese

DIVIDI IN CATEGORIE

In quale fase succede?

CARTE DA SISTEMARE

- Stima dei costi
- Collaudo finale
- Lezioni apprese
- Nomina del PM
- Diagramma di Gantt
- Foto dei prodotti
- Studio di fattibilità
- Scrittura del codice

Avvio

Pianificazione


Esecuzione

Chiusura

TRASCINA SULLO SCHEMA

Che cosa cambia mentre il progetto avanza

Qualità del prodotto | Rischio e incertezza | Costi e personale | Costo di una modifica

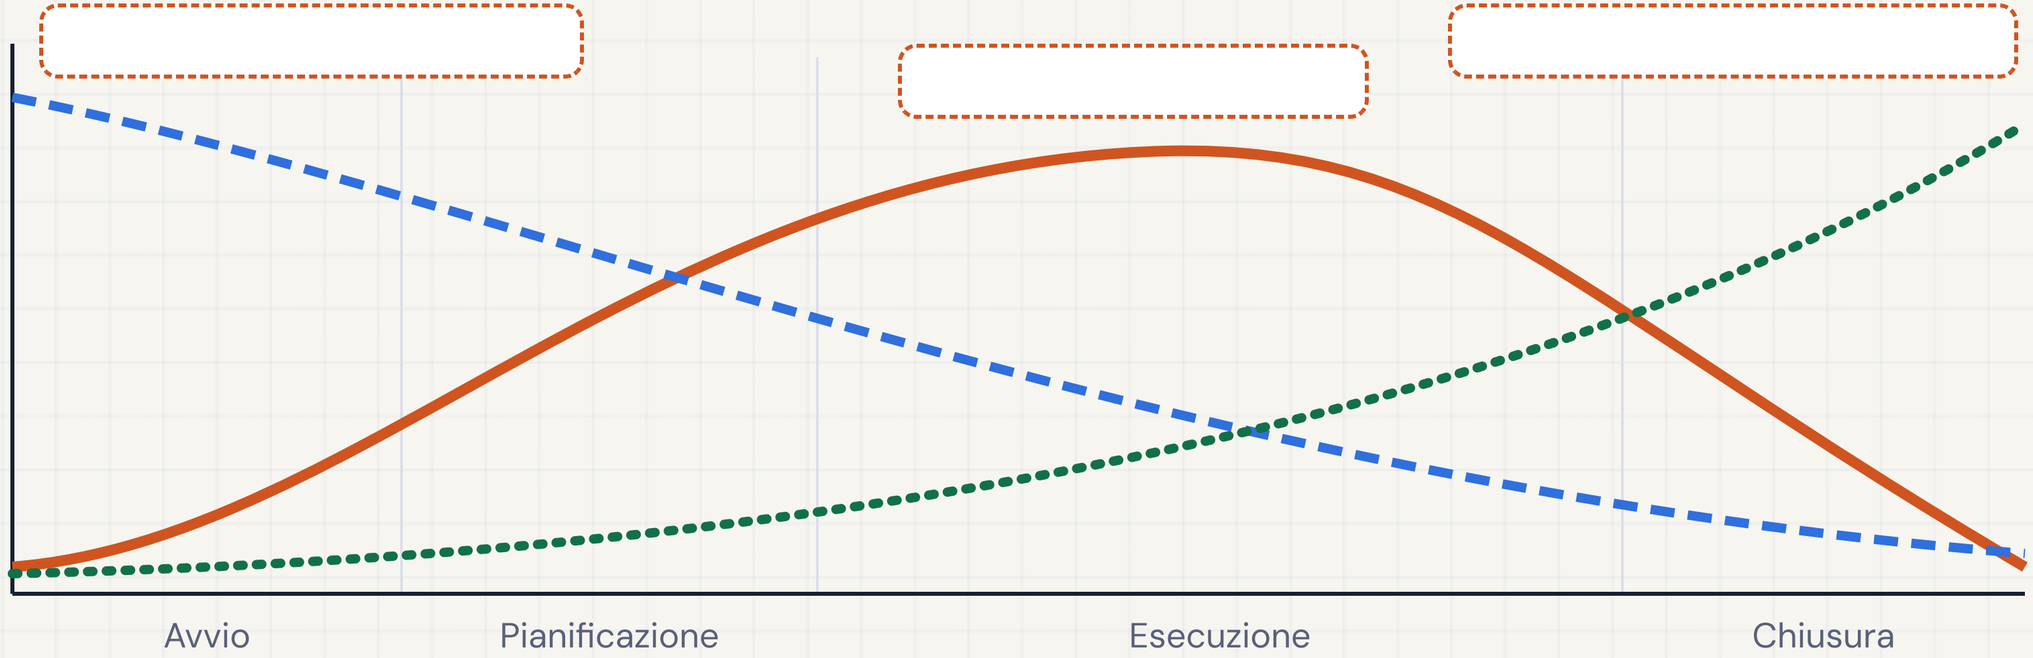

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quando si fa il monitoraggio e controllo?

QUIZ

A Subito dopo l'esecuzione, prima della chiusura

B Per tutta la durata del progetto, in parallelo alle altre fasi

C Solo alla fine, con il collaudo del cliente

D Solo quando qualcosa va storto

TRA UNA FASE E L'ALTRA

Il cancello: si va avanti solo se si decide di farlo

Alla fine di ogni fase c'è una **revisione di fase** (in inglese *phase gate*): committente e project manager guardano i risultati e decidono.

- **Avanti:** la fase è chiusa, si passa alla successiva
- **Ripeti:** mancano pezzi, si rifà una parte
- **Stop:** il progetto non conviene più e si chiude

Al panificio

Dopo lo studio di fattibilità si scopre che le consegne a domicilio costano troppo. Decisione: si parte solo con il ritiro in negozio. Meglio scoprirlo ora che a sito finito.

ABBINA

A che cosa serve ogni documento?

Studio di fattibilità	Raccoglie che cosa rifare e che cosa evitare
Project charter	Autorizza il progetto e nomina il project manager
Piano di progetto	Dice se il progetto si può fare e se conviene
Stato di avanzamento	Registra che il cliente accetta il risultato
Verbale di collaudo	Raccoglie WBS, tempi, costi, risorse e rischi
Lezioni apprese	Confronta il lavoro fatto con quello previsto

PROGETTO O PRODOTTO?

Il progetto finisce, il prodotto continua a vivere

Il **ciclo di vita del progetto** si chiude con la consegna. Il **ciclo di vita del prodotto** (il sito) prosegue con uso, manutenzione e dismissione. Dove va ogni carta?

CARTE DA SISTEMARE

- Ordini dei clienti
- Kick-off del team
- Piano dei tempi
- Chiusura del contratto
- Collaudo di consegna
- Backup ogni notte
- Spegnimento del vecchio sito
- Aggiornamento dei prezzi

Ciclo di vita del progetto

Ciclo di vita del prodotto

METTITI ALLA PROVA

Quando è finito, davvero, il progetto dell'e-commerce?

QUIZ

A Quando il codice è scritto e funziona

B Quando il sito è online e arriva il primo ordine

C Quando è finito il budget

D Quando il cliente ha accettato e il progetto è chiuso anche sulla carta

IN GRUPPO · 25 minuti

Il ciclo di vita dell'open day di informatica

1. Gruppi da 3 o 4. Progetto: lo stand di informatica all'open day della scuola, tra due mesi.
2. Apri Writer e crea una tabella con 3 colonne: **Fase**, **Due attività**, **Documento prodotto**.
3. Compila una riga per ognuna delle cinque fasi, monitoraggio compreso.
4. Sotto la tabella scrivi una decisione possibile alla revisione di fase dopo l'avvio.
5. Salva come **ciclo-vita-gruppoN.odt** (N = numero del gruppo) e consegna.

Controllo: 5 righe; ogni documento è coerente con la fase (per esempio il project charter in avvio, il Gantt in pianificazione, la relazione finale in chiusura). Il monitoraggio ha attività che durano tutto il progetto.

AL COMPUTER · 20 minuti

Dove finiscono le ore del progetto?

1. Apri Calc. In A1 **Fase**, in B1 **Ore**, in C1 **Percentuale**.
2. Da A2 ad A6 le fasi; in B2:B6 le ore stimate per l'e-commerce: 16, 40, 220, 30, 24.
3. In B7 `=SOMMA(B2:B6)`; in C2 `=B2/B$7`, copia fino a C6 e formatta come percentuale.
4. Inserisci un grafico a colonne delle ore per fase.
5. In A9 scrivi perché l'esecuzione pesa così tanto. Salva come **ciclo-vita-ore.ods**.

	A	B	C
1	Fase	Ore	Percentuale
2	Avvio	16	=B2/B$7
3	Pianificazione	40	
4	Esecuzione	220	
5	Monitoraggio	30	
6	Chiusura	24	
7	Totale	=SOMMA(B2:B6)	

Controllo: totale 330 ore; esecuzione 66,67%, pianificazione 12,12%, avvio 4,85%.

IERI E OGGI

Anche l'intelligenza artificiale ha un ciclo di vita



All'esame: per presentare il progetto di PCTO o di un'altra materia, raccontalo fase per fase: avvio, pianificazione, esecuzione, controllo, chiusura. Per ogni fase cita un documento prodotto.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

avvio | budget | monitoraggio | prodotto | charter | esecuzione | cresce

Il progetto viene autorizzato con il project _____ nella fase di _____.

Il _____ accompagna tutte le fasi e confronta il fatto con il previsto.

Il costo di una modifica _____ man mano che il progetto avanza.

Il progetto finisce con l'accettazione del cliente; il _____ invece continua a vivere.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Avvio, pianificazione, esecuzione, chiusura
- Monitoraggio e controllo per tutto il progetto
- Ogni fase produce documenti e finisce con una revisione
- Rischio alto all'inizio, modifiche care alla fine
- Il progetto si chiude, il prodotto continua
- Prossima lezione: avvio e pianificazione, la WBS

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.
