GPOI · UNITÀ 3

Il risk management

Non si possono eliminare tutti i rischi, ma si possono conoscere, pesare e gestire prima che diventino problemi. Con un metodo in cinque fasi e una matrice.

PER COMINCIARE

Per te, che cos'è un rischio?

SONDAGGIO

- **A** Un pericolo, qualcosa che può fare male
- **B** La probabilità di perdere qualcosa
- **C** Un'incertezza che può avere effetti positivi o negativi
- **D** Qualcosa da evitare sempre

LA DEFINIZIONE · ISO 31000:2018

Rischio: l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi

Incertezza

Non sappiamo se l'evento accadrà, né quanto peserà.

Obiettivi

Un rischio esiste sempre rispetto a qualcosa che vogliamo ottenere.

Effetto

Può essere negativo (minaccia) o positivo (opportunità).

Per misurarlo, nella pratica

Rischio = Probabilità × Impatto

LA NORMATIVA

Chi dice come gestire i rischi

ISO 31000:2018

Linee guida per qualunque organizzazione e qualunque tipo di rischio. Non è certificabile: è un riferimento di metodo.

D.Lgs. 81/2008

Per la sicurezza sul lavoro la valutazione dei rischi è un **obbligo** del datore di lavoro, con il DVR (documento di valutazione dei rischi).

ISO 9001:2015 e sorelle

I sistemi di gestione chiedono di considerare rischi e opportunità (risk-based thinking).

Project management

Le guide del PMI e i metodi di progetto dedicano un'area alla gestione dei rischi di progetto.

QUIZ

Quale di queste affermazioni è vera?

QUIZ

A La ISO 31000 è obbligatoria per tutte le imprese

B Un'impresa può farsi certificare secondo la ISO 31000

C Il DVR serve solo alle imprese con più di 50 dipendenti

D Chi ha anche un solo lavoratore deve valutare i rischi per la sicurezza

METTI IN ORDINE

Le cinque fasi della gestione del rischio

1. Trattamento: che cosa facciamo per ciascuno?
2. Identificazione: quali rischi esistono?
3. Analisi: con che probabilità e quale impatto?
4. Monitoraggio e riesame: come cambiano nel tempo?
5. Valutazione: quali sono accettabili e quali no?

METTITI ALLA PROVA

In quale fase siamo?

CARTE DA SISTEMARE


- Backup automatico ogni notte
- Stimare probabilità e impatto
- Confronto con la soglia accettabile
- Lista di controllo dei progetti passati
- Rivedere il registro ogni mese
- Controllare gli indicatori di allarme
- Brainstorming sui possibili problemi
- Stipulare un'assicurazione

Identificazione	Analisi e valutazione	Trattamento	Monitoraggio

LA MATRICE PROBABILITÀ × IMPATTO

Metti ogni rischio nella sua casella

Fornitore · Bug · Malattia · Server · Rischio zero

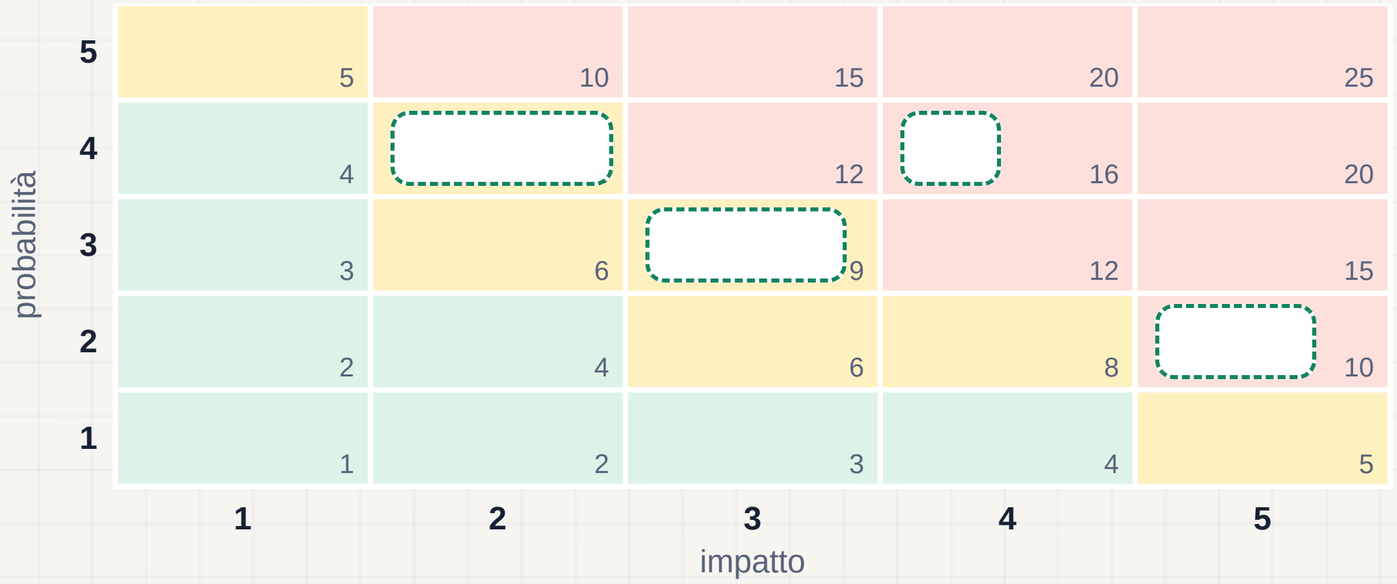

Server P2 · I5
il server cloud si guasta

Fornitore P4 · I2
i PC nuovi arrivano in ritardo

Malattia P3 · I3
lo sviluppatore si ammala una settimana

Bug P4 · I4
un errore grave arriva al cliente

Verde basso (1-4) · giallo medio (5-9) · rosso alto (10-25)

QUIZ A TRABOCCHETTO

Rischio A: P = 1, I = 5. Rischio B: P = 5, I = 1.

QUIZ

Quale va trattato per primo?

A A: l'impatto conta sempre più della probabilità

B B: succederà quasi sicuramente

C Hanno lo stesso punteggio: decide il contesto, la matrice da sola non basta

D Nessuno: un punteggio di 5 è sempre trascurabile

IL TRATTAMENTO

Quattro risposte a una minaccia

Evitare

Cambiare il piano perché il rischio non esista più.

Ridurre

Abbassare la probabilità o l'impatto (mitigare).

Trasferire

Spostare l'impatto su altri: assicurazione, contratto.

Accettare

Tenerlo, con una riserva di tempo o di denaro.

Ogni rischio importante ha un **responsabile** (risk owner), un'azione, una scadenza. E un rischio trattato lascia un **rischio residuo**.

ABBINA

Ogni strategia al suo esempio

Evitare	---	Non usare una libreria che non è più aggiornata
Ridurre	---	Test automatici prima di ogni rilascio
Trasferire	---	Polizza assicurativa contro i danni ai server
Accettare	---	Segnalare al committente un rischio fuori dal controllo del team
Escalation	---	Due giorni di riserva alla fine del piano

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

I rischi piccoli sono i più pericolosi

> **Come fa un progetto ad accumulare un anno di ritardo? Un giorno alla volta.**
>
> **Fred Brooks**, informatico, capo del progetto IBM System/360, *The Mythical Man-Month*, 1975

Per questo il risk management non finisce dopo la matrice: il monitoraggio settimanale vede i piccoli ritardi prima che diventino un anno.

AL COMPUTER · 30 minuti

Il registro dei rischi di Officina Digitale

	A	B	C
1	Rischio	P	I
2	Server cloud giù il giorno della consegna	2	5
3	Il cliente cambia i requisiti a metà	4	3
4	Sviluppatore malato una settimana	3	2
5	Furto di credenziali (phishing)	2	4
6	PC nuovi consegnati in ritardo	3	1
7	Bug grave scoperto dal cliente	3	4

1. Copia la tabella in **Calc** (impresa di esempio).
2. D2: `=B2*C2`. E2: `=SE(D2>=10;"alto";SE(D2>=5;"medio";"basso"))`. Copia in basso.
3. Colora E con la formattazione condizionata. Ordina per D decrescente.
4. Per i rischi alti scrivi in F la strategia e in G il responsabile.
5. Salva **rischi_cognome.ods**.

Controllo: 3 rischi alti, 2 medi, 1 basso.

IL RISCHIO NELL'AI ACT (REG. UE 2024/1689)

Che livello di rischio per la legge europea?

CARTE DA SISTEMARE

- Video deepfake
- AI che seleziona i CV
- AI nei videogiochi
- Punteggio sociale dei cittadini
- Riconoscere le emozioni dei dipendenti
- AI che valuta gli esami
- Filtro antispam
- Chatbot del servizio clienti

Vietato	Alto rischio	Obblighi di trasparenza	Rischio minimo

IERI E OGGI

Rischi dell'AI e AI per i rischi



All'esame

Il rischio è un ponte tra molte materie: il registro dei rischi del tuo progetto (GPOI), la sicurezza dei dati (Sistemi e reti), la valutazione dei rischi del PCTO (D.Lgs. 81/2008). Porta una matrice compilata da te.

IN GRUPPO · 30 minuti

Il piano di risposta ai rischi della vostra impresa

1. Riprendete l'idea d'impresa e la SWOT: debolezze e minacce sono una miniera di rischi.
2. Fate un brainstorming di 5 minuti: almeno 8 rischi, anche uno positivo.
3. Stimate P e I (da 1 a 5) e disegnate la matrice in **Writer** o in **Calc**.
4. Per i 3 rischi più alti: strategia, azione concreta, responsabile, segnale d'allarme.
5. Salvate come **rischi_gruppo.odt** (o **.ods**).

Controllo: ogni azione ha un nome e una scadenza. "Stare attenti" non è un'azione; "backup ogni notte, lo controlla Sara il lunedì" sì.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole giuste

incertezza | pericolo | eliminare | impatto | residuo | trasferire

Per la ISO 31000 il rischio è l'effetto dell' _____ sugli obiettivi.

Nella matrice il punteggio è probabilità per _____.

Un'assicurazione serve a _____ il rischio.

Il rischio che resta dopo il trattamento si chiama rischio _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Rischio: effetto dell'incertezza sugli obiettivi
- ISO 31000 (metodo), D.Lgs. 81/2008 (obbligo)
- Identificare, analizzare, valutare, trattare, monitorare
- Matrice P × I: utile, ma non basta da sola
- Evitare, ridurre, trasferire, accettare
- Ogni rischio ha un responsabile e un'azione

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.
